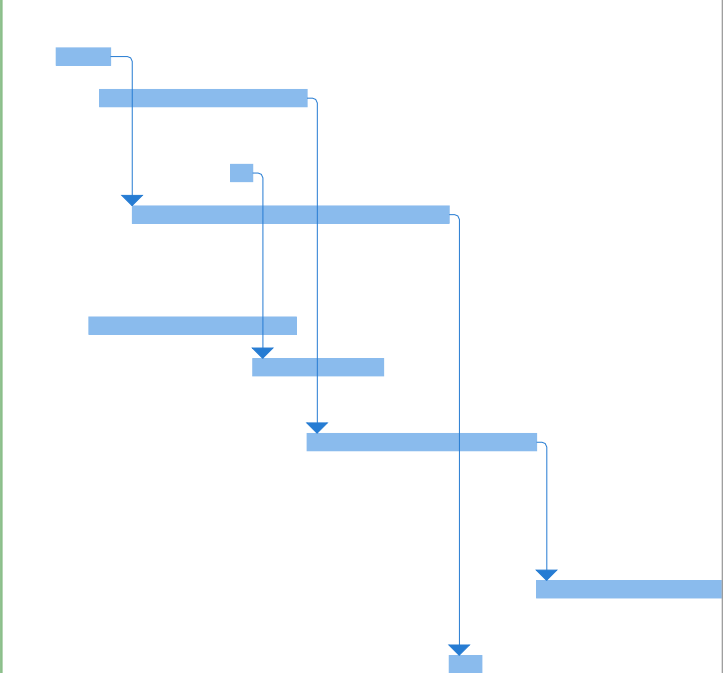


Id	Mod de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	13 20 27 abr '22 3 10 17 24 may '22 1 8 15 22 29 jun '22 5													
0		COLEGIO COMFIAR	45 días	lun 4/04/22	vie 3/06/22														
1		1 LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA SENDE	5 días	lun 4/04/22	vie 8/04/22														
2		2 DESMONTE DE GRAVILLA EXISTENTE EN LOS AULAS, INCLUYE HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	13 días	vie 8/04/22	mar 26/04/22														
3		3 RETIRO DE ESCOMBROS (6M3)	2 días	mié 20/04/22	jue 21/04/22														
4		4 PLACA DE PISO ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI ACABADO ESTAMPADO E=10CM, INCLUYE BORDILLO.	21 días	lun 11/04/22	lun 9/05/22														
5		5 MORTERO DE NIVELACIÓN E=5CM	13 días	jue 7/04/22	lun 25/04/22														
6		6 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA METALICA PARA CUBIERTA.	8 días	vie 22/04/22	mar 3/05/22														
7		7 CUBIERTA STANDING SEAM TIPO SANDWICH CALIBRE 26 INCLUYE AISLAMIENTO POLIESTILENO 38 MM DE ESPESOR. INCLYE ELEMENTOS DE FIJACION.	15 días	mié 27/04/22	mar 17/05/22														
8		8 PISO VINILICO ACOLCHADO MULTICOLOR INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN	13 días	mié 18/05/22	vie 3/06/22														
9		9 LAMINA DE ACERO CORRUGADA	3 días	mar 10/05/22	jue 12/05/22														

Proyecto: COLEGIO COMFIAR
Fecha: mié 30/03/22

Tarea 
